

議案第 62 号

工事請負変更契約の締結について

平成 28 年第 4 回山都町議会定例会において議決された、白小野鶴越線②道路災害復旧工事の請負契約のうち、請負代金額「98,604,000 円」を「102,100,119 円」に変更することとする。

平成 29 年 9 月 7 日提出

山都町長 梅 田 穰

(提案理由)

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17 年山都町条例第 55 号）第 2 条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これがこの議案を提出する理由です。

工事請負変更契約概要

- 1 工 事 番 号 28災補道矢第4415号
- 2 工 事 名 白小野鶴越線②道路災害復旧工事
- 3 工 事 場 所 山都町 津留 地内
- 4 工事変更内容 復旧延長 $L = 127.0\text{m}$
掘削工(土砂、岩) $V = 12,713\text{m}^3$
法面植生工 $A = 78\text{m}^2$
モルタル吹付工 $A = 2,707\text{m}^2$
アスファルト舗装工 $A = 1,010\text{m}^2$
排水工(L型側溝等) 一式
- 5 契約の相手方 熊本県上益城郡山都町下市242-1
株式会社 坂本建設
代表取締役 中崎 晃紀

当初契約との数量比較

内 容	当初契約	変更契約	増△減
掘削工（土砂、岩）	12,626 m ²	12,713 m ³	87 m ³
法面植生工	425 m ²	78 m ²	△ 347 m ²
モルタル吹付工	2,235 m ²	2,707 m ²	472 m ²

当初契約との金額

内 容	当初契約	変更契約	増△減
掘削工（土砂、岩）	6,347,000	6,379,000	32,000
法面植生工	838,000	153,000	△ 685,000
モルタル吹付工	12,091,000	14,644,000	2,553,000
計			1,900,000

↑

（直接工事費）



仮

公共工事請負変更契約書



- 1 工事番号 28災補道矢 第4415号
- 2 工事名 白小野鶴越線② 道路災害復旧工事
- 3 工事場所 山都町 津留 地内
- 4 変更契約事項

変更工事請負額

増額

億	千	百	十	万	千	百	十	円
	¥	3	4	9	6	1	1	9

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥258,971 円)

工事の内容 別冊のとおり

- 5 解体工事に要する費用等 別紙のとおり
- (※設計図書の変更に伴い契約書別紙に変更がある場合のみ)

平成 28 年 12 月 1 日 付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項
のとおり請負契約を変更する。 なお議会の議決を得られたとき、本契約としての効力を生ずるものとする。
本変更契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

平成 29 年 8 月 24 日

発注者 山 都 町

代 表 者 山都町長 梅 田 稔




受注者 住 所
商号又は名称
代表者氏名

熊本県上益城郡山都町下市242-1
株式会社 坂 本 建 設
代表取締役 中 崎 晃



山都町全図

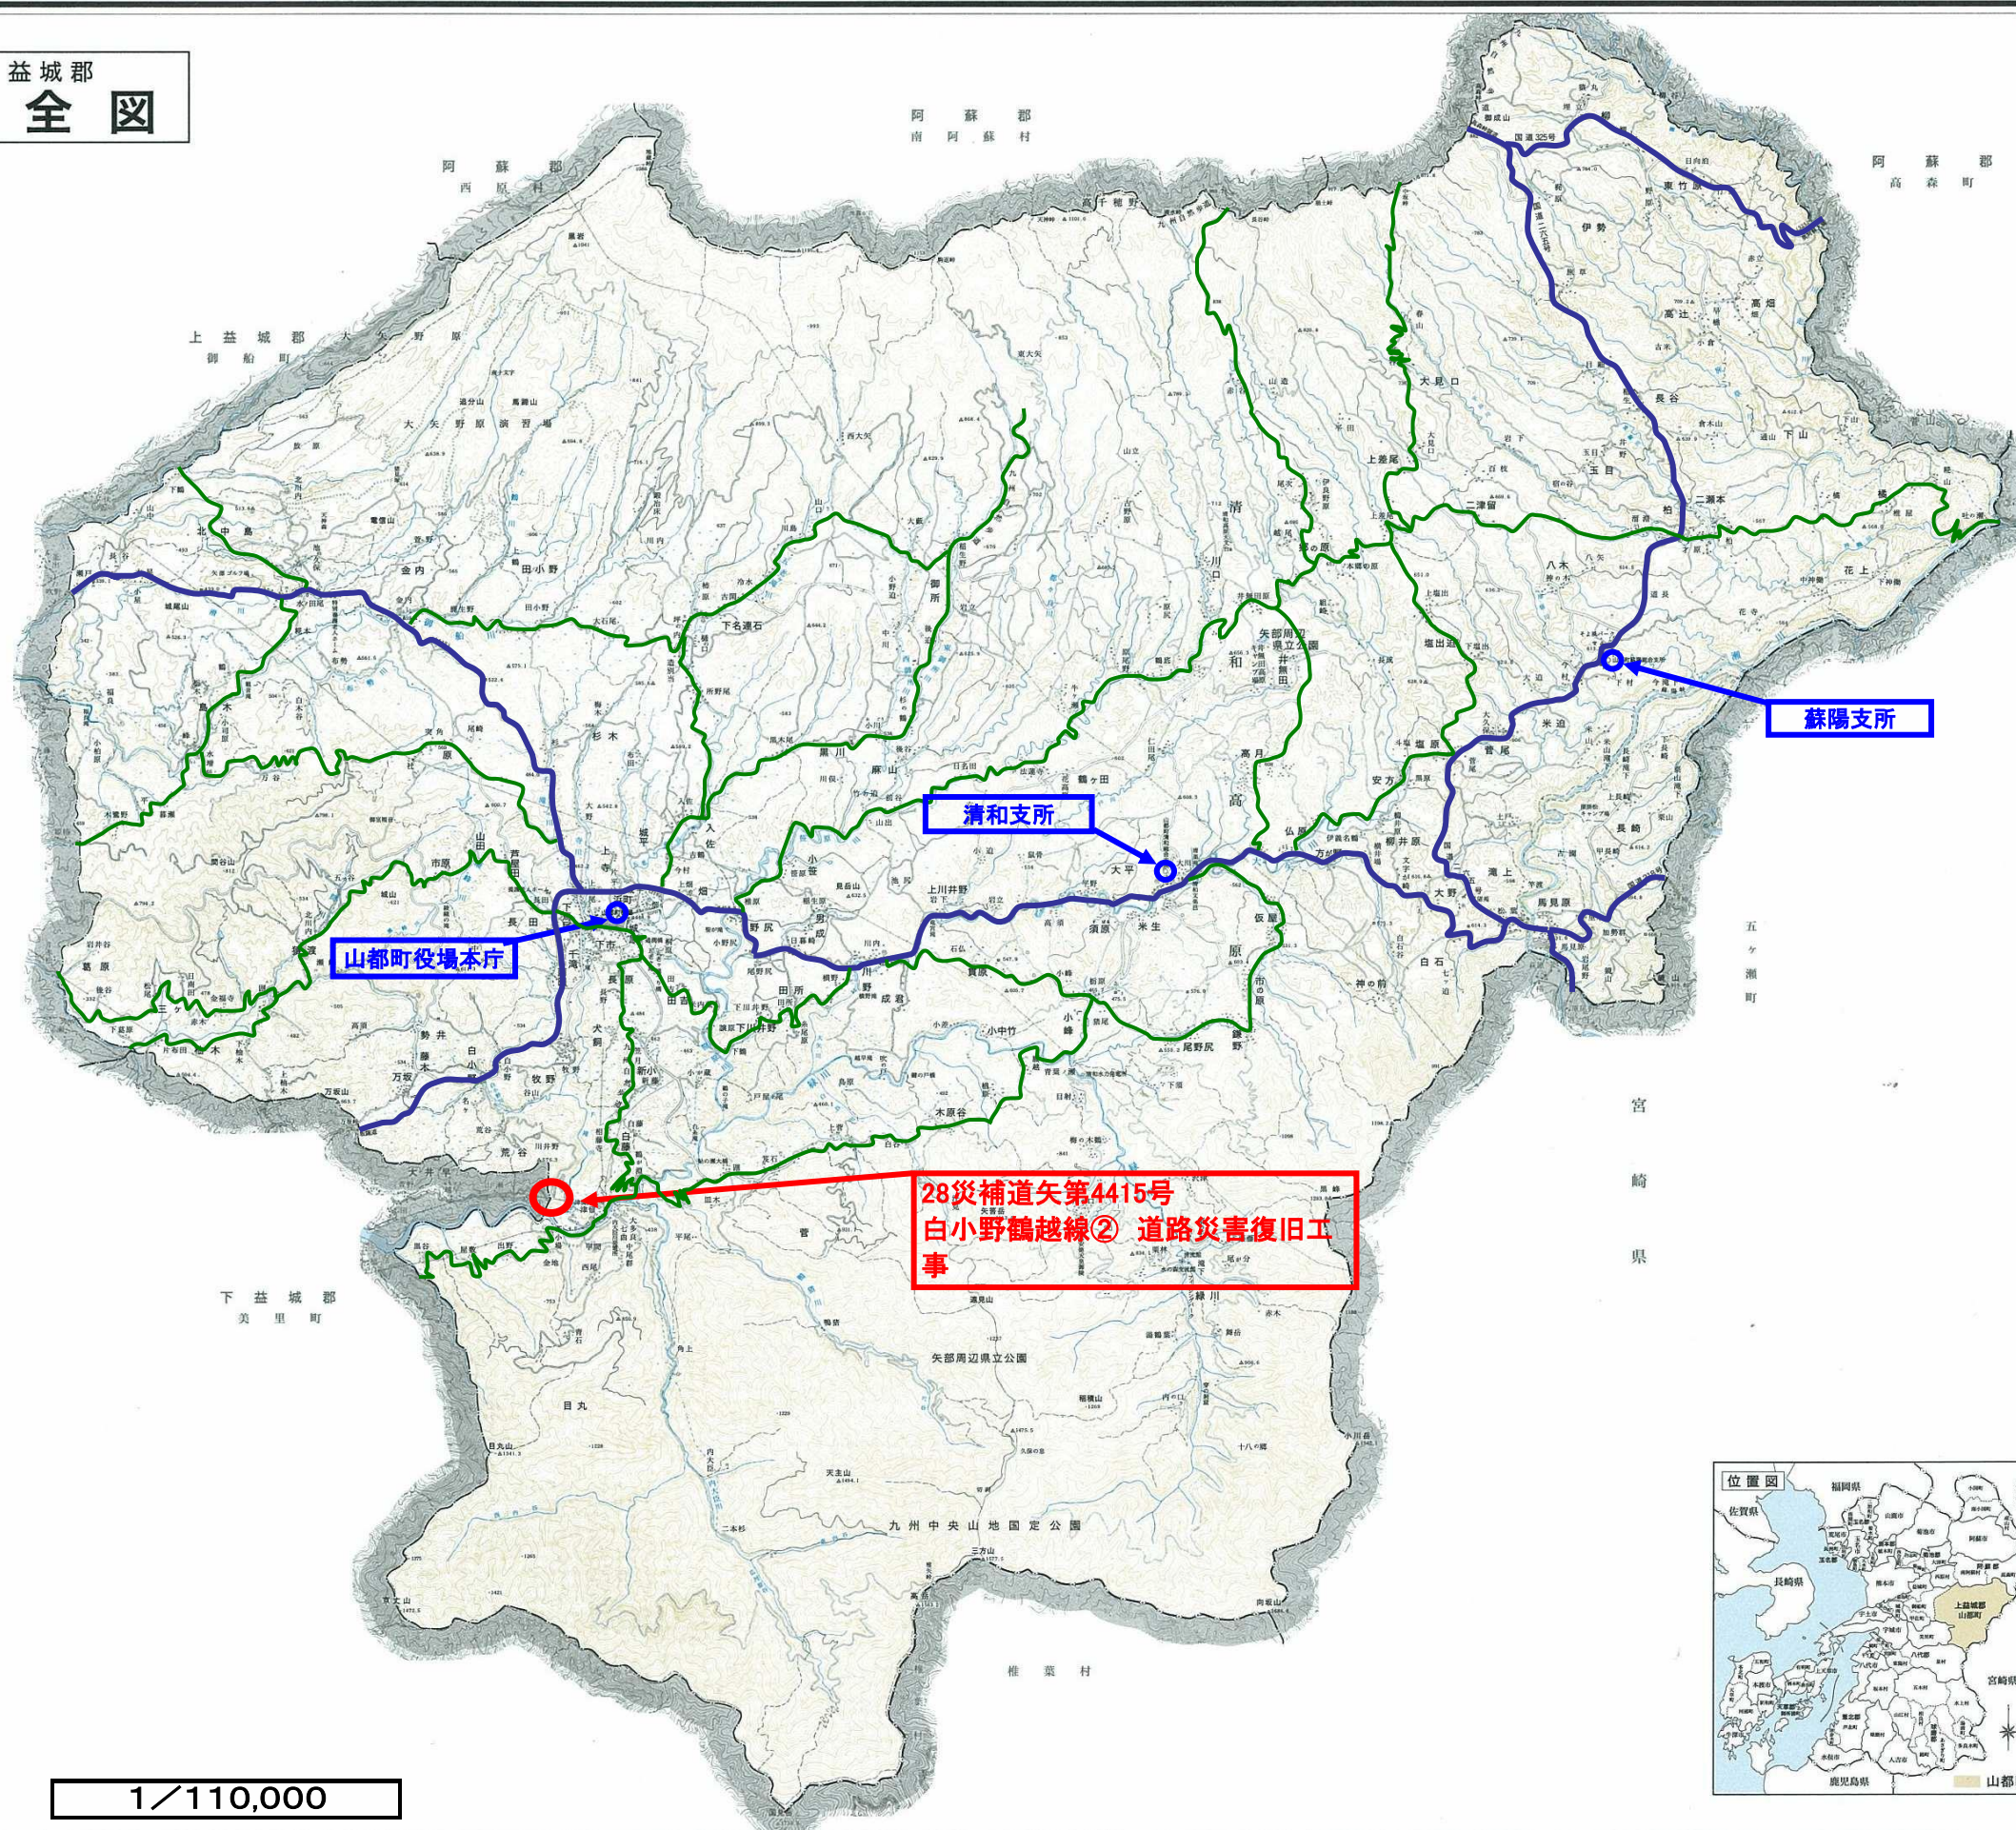

蘇陽支所

清和支所

山都町役場本庁

28災補道矢第4415号
白小野鶴越線② 道路災害復旧工
事

[illegible]

1:110,000

1/110,000

[illegible]

