

議案 第71号

工事請負変更契約の締結について

令和5年第2回臨時会において議決された津留線道路災害復旧工事のうち、契約金額「51,480,000円」を「61,385,292円」に変更することとする。

令和5年9月28日 提出

山都町長 梅田 穰

(提案理由)

本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年山都町条例第55号）第2条の規定により、議会の議決を経る必要があります。

これが、この議案を提出する理由です。

工事請負変更契約概要

- 1 工事番号 4 災補道矢第 200 号
- 2 工事名 津留線道路災害復旧工事
- 3 工事場所 山都町 津留 地内
- 4 当初契約年月日 令和 5 年 2 月 15 日

5 財源内訳

種別	変更前	変更後	増減	備考
負担金	34,337,000	40,943,000	6,606,000	公共土木施設災害復旧事業国庫負担金
起債	17,100,000	20,400,000	3,300,000	災害復旧事業債
一般財源	43,000	42,292	△708	町費
合計	51,480,000	61,385,292	9,905,292	

- 6 工事内容 復旧延長 L = 53.0m
- 現場打軽量吹付法砕工 722m²
- 植生工 970m²
- ブロック積工 126m²
- アスファルト舗装工 130m²
- L型側溝布設替 48m
- 防護柵設置工（構造物用） 24m

- 7 契約の相手方 上益城郡山都町南田 220-1
矢部開発株式会社
代表取締役 上田 信

変更数量増減表

4災補道矢第200号

津留線道路災害復旧工事

項目	単位	数量		増減	備考
		当初	変更		
施工延長	m	53.0	53.0	0.0	
道路土工	m3	3,137	3,125	△ 12	
法面工	m2	1,694	1,692	△ 2	
ブロック積工	m2	126	126	0	
擁壁工	m3	1.6	1.6	0	
舗装工	m2	130	130	0	
排水構造物工	m	48	48	0	
防護柵工	m	25	24	△ 1	
雑工(石積工)	m2	8.3	8.3	0	
構造物撤去工	t	28.4	31.4	3.0	



公共工事請負変更契約書

- 1 工事番号 4災補道矢 第200号
- 2 工事名 津留線 道路災害復旧工事
- 3 工事場所 山都町 津留 地内
- 4 変更契約事項

変更工事請負額

増額

億	千	百	十	万	千	百	十	円
	¥	9	9	0	5	2	9	2

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥900,481 円)

工事の内容 別冊のとおり

- 5 解体工事に要する費用等 別紙のとおり

(※設計図書の変更に伴い契約書別紙に変更がある場合のみ)

令和5年2月15日付けで請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項のとおり請負契約を変更する。

本変更契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決を得られないとき無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。

令和5年9月22日

発注者 山都町

代表者 山都町長 梅田




受注者 住 所
商号又は名称
代表者氏名

上益城郡山都町南田220-1
矢部開発 株式会社
代表取締役 上田 信



平面図

S=1:250

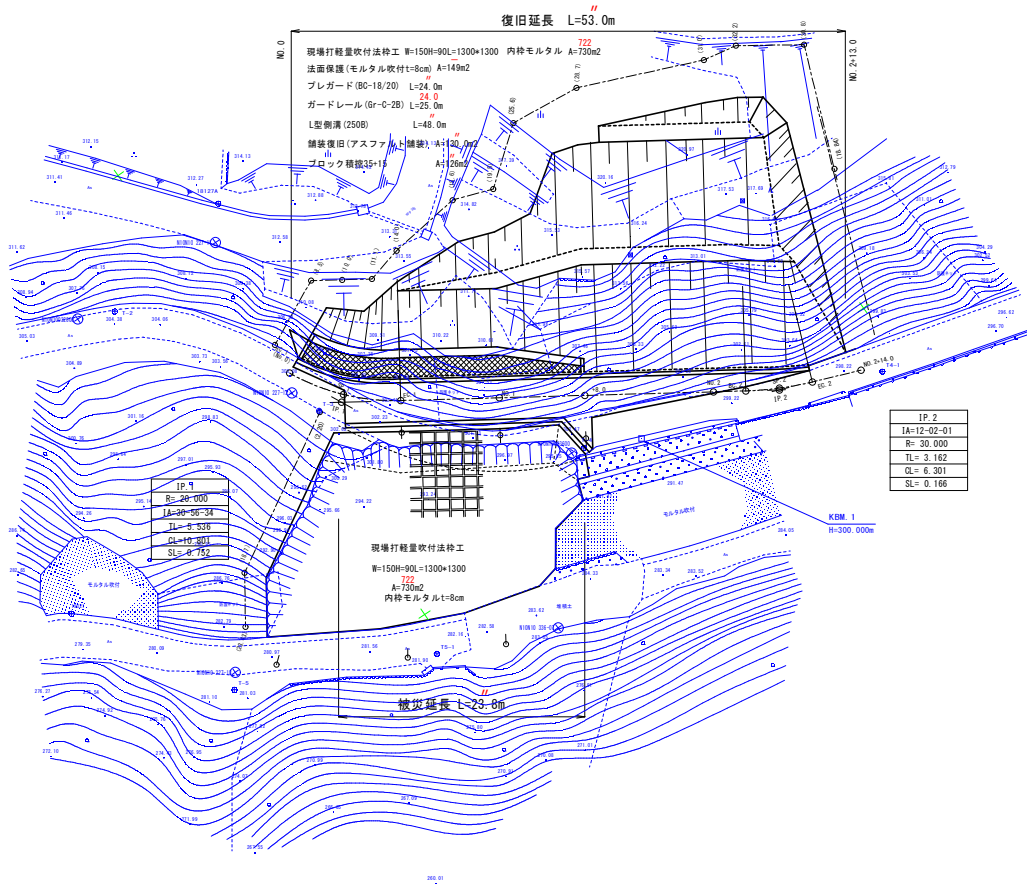

変更

4 災補道第 200 号	
工事名	令和4年度 道路災害復旧工事
路線名	町道津留線
工事箇所	上益城郡山都町津留地内
図面種類	平面図
縮尺	1:250
図面番号	全 16 葉 第 1 号
精査	設計 製図 謄写

①植生マット工 ②植生マット工（厚層タイプ） ③現場打軽量吹付法砕工

