

山都町週休 2 日工事实施要領

(令和 6 年 3 月 2 9 日伺定)

第 1 条 (趣旨)

建設業界では、若手技術者の離職や入職者の減少など、将来の担い手確保が大きな課題となっており、建設現場における労働環境の改善が求められている。そのため、山都町では労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業界の週休 2 日普及に向け「週休 2 日工事」を実施する。

第 2 条 (週休 2 日工事の定義)

(1) 週休 2 日工事

①月単位の週休 2 日工事とは、対象期間において、全ての月で 4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる工事をいう。

②通期の週休 2 日工事とは、対象期間において、4 週 8 休以上の現場閉所を行ったと認められる工事をいう。

やむを得ず計画した現場閉所に作業が生じる場合は、振替えの現場閉所を確保するものとする。

(2) 現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて 1 日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

(3) 対象期間

工事着手日から工事施工範囲内で全ての作業（後片付けを含む）が完了した日までとする（工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない）。よって、工事施工範囲内での全ての作業が完了した後に、現場事務所で行う書類作成・整理については、週休 2 日の対象期間外の作業として取り扱う。

なお、年末年始 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外とする期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）についても週休 2 日工事の対象期間に含まない。

(4) 現場閉所率

現場閉所率 = 対象期間内の現場閉所日数 ÷ 対象期間の日数

第3条 (対象工事)

山都町が発注する建設工事のうち、入札公告等に週休2日工事の対象であることを明示した工事を対象とする。

第4条 (発注方式)

次のいずれかによる方式を基本とする。

なお、社会的要請や現場条件の制約等により現場閉所を行うことが困難な工事については、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保の取組を推進するものとする。

(1) 発注者指定方式

発注者が、月単位の週休2日工事に取り組むことを指定する方式（通期の週休2日は必須）

(2) 受注者希望方式

受注者が、工事着手前に、発注者に対して月単位の週休2日工事に取り組む旨を協議したうえで取り組む方式（通期の週休2日は必須）

第5条 (実施方法等)

(1) 条件明示等

発注者は、月単位の週休2日工事の対象であることを入札公告等に明示する。（別紙1参照）

(2) 受注者による意思表示

受注者は、受注者希望方式の工事については、工事着手日前に「月単位の週休2日工事」実施の意向について、書面で監督員と協議を行い、実施の有無を決定する。ただし、週休2日実施に伴う工期の変更は行わないこととする。

「月単位の週休2日工事」の実施を希望しない場合は、次項以降の規定は適用しない。

(3) 看板等による表示

受注者は「週休2日工事」である旨を看板等で現場に掲示する（別紙2

参照)

(4) 閉所計画

月単位の週休2日工事の受注者は、施工計画書提出時に週休2日取得の計画日が確認できる現場閉所計画実績表(別紙3参照)を監督員に提出する。

なお、追加工事等に伴い工期が変更となる場合は、その都度、現場閉所計画実績表(変更)を監督員に提出しなければならない。

(5) 実施報告

月単位の週休2日工事の受注者は、現場閉所計画実績表により休日(現場閉所)の実施状況をとりとまとめ、毎月、監督員に提出する。

(6) 確認の方法

監督員は、受注者から提出された現場閉所計画実績表により休日(現場閉所)の実施状況を確認する。

第6条(工事費の積算)

(1) 当初設計

発注時は月単位の週休2日達成を前提とした積算を行う。

(2) 変更設計

現場閉所率の達成状況を確認後、月単位の週休2日に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数に変更するものとし、通期の4週8休に満たないものについては、通期の週休2日の補正係数を除した変更を行うものとする。

また、工事着手前に月単位の週休2日に取り組むことについて、受発注者の協議が整わなかったもの(受注者が月単位の週休2日の取り組みを希望しないものを含む)については、補正係数を除した変更を行うものとする。

なお、工期の途中であっても毎月提出される現場閉所計画実績表の確認により、明らかに週休2日の達成が見込めない場合や工事の進捗状況の確認により週休2日の達成が見込めないと判断される場合は、受発注者双方の合意により補正係数を変更又は除した変更を行うことができるものとする。

附 則

本要領は令和6年4月1日以降の入札公告等を行う工事に適用する。

入札公告等の記載例（週休2日工事）

入札公告等に以下を追記する。

月単位の週休2日工事（発注者指定方式）の場合

月単位の週休2日工事（発注者指定方式）

本工事は、月単位の週休2日工事の対象工事であり、入札公告に示した予定価格は、「月単位の4週8休」を見込んだ補正を行った金額である。

入札に当たっては、「月単位の4週8休」の実施を前提とした積算により応札すること。

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「月単位の4週8休」に満たない場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更するものとする。

月単位の週休2日工事（受注者希望方式）の場合

本工事は、月単位の週休2日工事の対象工事であり、入札公告に示した予定価格は、「月単位の4週8休」を見込んだ補正を行った金額である。

入札に当たっては、「月単位の4週8休」の実施予定の有無に関わらず、「月単位の4週8休」の実施を前提とした積算により応札すること。


受注者は、工事着手前日までに週休2日の実施の意向について、書面で監督員と協議を行うこと。

なお、工事着手日までに週休2日の実施の意向について、書面で協議されなかった場合には、週休2日は未実施として取扱い、請負代金額を減額変更する。

また、施工後に休日の達成状況を確認後、「月単位の4週8休」に満たない場合は、その達成状況に応じて補正係数を見直し、請負代金額を減額変更するものとする。

標示板の例

(別紙2)

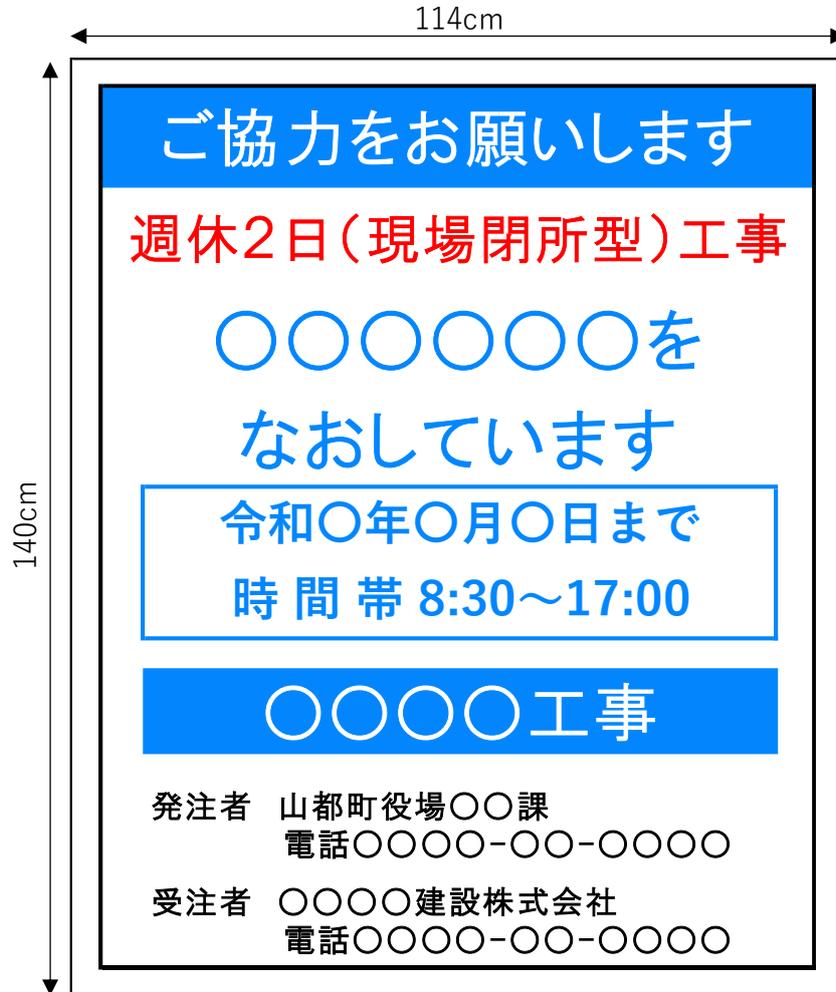

現場閉所計画実績表

(記入例)

(別紙3)

工事名:○○○工事(○○○工区)

期 間:令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日(契約工期を記載)

カレンダー開始日 2024/4/1 年 2024

現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合
閉所の割合 ≥ 28.5 4週8休以上達成

- 【凡例】
- 休日(予定)
 - 休日(実施)
 - 作業日(※空欄)
 - ◇ 対象期間外

毎月、現場閉所率の確認を行う

月毎の確認

月	4																																			
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
行事																																				
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

計画	対象期間	0
計画	閉所日数	0
計画	現場閉所率	
実施	対象期間	0
実施	閉所日数	0
実施	現場閉所率	

月	5																																					
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
行事																																						
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

計画	対象期間	20
計画	閉所日数	6
計画	現場閉所率	30.0% 4週8休以上
実施	対象期間	20
実施	閉所日数	6
実施	現場閉所率	30.0% 4週8休以上

月	6																																									
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
行事																																										
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

計画	対象期間	30
計画	閉所日数	9
計画	現場閉所率	30.0% 4週8休以上
実施	対象期間	30
実施	閉所日数	9
実施	現場閉所率	30.0% 4週8休以上

月	7																																								
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
行事																																									
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

計画	対象期間	31
計画	閉所日数	10
計画	現場閉所率	32.3% 4週8休以上
実施	対象期間	31
実施	閉所日数	10
実施	現場閉所率	32.3% 4週8休以上

月	8																																											
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31													
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
行事																																												
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

計画	対象期間	28
計画	閉所日数	8
計画	現場閉所率	28.6% 4週8休以上
実施	対象期間	28
実施	閉所日数	8
実施	現場閉所率	28.6% 4週8休以上

月	9																																								
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
行事																																									
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

計画	対象期間	31
計画	閉所日数	9
計画	現場閉所率	29.0% 4週8休以上
実施	対象期間	31
実施	閉所日数	9
実施	現場閉所率	29.0% 4週8休以上

月	10																																													
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31															
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
行事																																														
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

計画	対象期間	31
計画	閉所日数	9
計画	現場閉所率	29.0% 4週8休以上
実施	対象期間	31
実施	閉所日数	9
実施	現場閉所率	29.0% 4週8休以上

現場閉所計画実績表

(記入例)

(別紙3)

工事名: ○○○工事(○○工区)

期間: 令和○年○月○日 ~ 令和○年○月○日(契約工期を記載)

カレンダー開始日 2024/4/1 年 2024

現場閉所日数 ÷ 対象期間 = 現場閉所の割合
閉所の割合 ≥ 28.5 4週8体以上達成

【凡例】

- 休日(予定)
- 休日(実施)
- 作業日(※空欄)
- ▨ 対象期間外

毎月、現場閉所率の確認を行う

月	11																															現場閉所率		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率		
曜日	日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	現場閉所率	
行事																																	現場閉所率	
計画				○	○						○	○																					9	60
実施				●	●						●	●																					9	60

月毎の確認

計画	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8体以上
実施	対象期間	31	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	29.0%	4週8体以上

月	12																															現場閉所率		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率		
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	現場閉所率		
行事																																	現場閉所率	
計画			○	○																													8	68
実施			●	●																													8	68

月毎の確認

計画	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8体以上
実施	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8体以上

月	1																															現場閉所率		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率		
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	現場閉所率		
行事																																	現場閉所率	
計画																																	8	76
実施																																	8	76

月毎の確認

計画	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8体以上
実施	対象期間	28	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	28.6%	4週8体以上

月	2																															現場閉所率		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率		
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	現場閉所率		
行事																																	現場閉所率	
計画																																	9	85
実施																																	8	84

月毎の確認

計画	対象期間	29	
	閉所日数	9	
	現場閉所率	31.0%	4週8体以上
実施	対象期間	29	
	閉所日数	8	
	現場閉所率	27.6%	4週8体未満

月	3																															現場閉所率		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場閉所率		
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	現場閉所率		
行事																																	現場閉所率	
計画																																	2	87
実施																																	3	87

月毎の確認

計画	対象期間	4	
	閉所日数	2	
	現場閉所率	50.0%	4週8体以上
実施	対象期間	4	
	閉所日数	3	
	現場閉所率	75.0%	4週8体以上

※1工事着手日: 始期日以降に準備工事(現場事務所の建設・測量等)、工場製作を含む工事における工場製作工に着手した日

※2作業完了日: 工事施工範囲内で全ての作業(後片付けを含む)が完了した日
(工事現場事務所は工事施工範囲外に設置するため、ここで言う後片付けの対象に含まない)

【算定除外期間】: 夏季休暇(8月13日~8月15日)、年末年始(12月29日~翌年1月3日)は算定期間の分母・分子に含めない

工事全体の確認

計画	全対象期間	291	
	全現場閉所日数	87	
	現場閉所率	29.9%	4週8体以上
実施	全対象期間	291	
	全現場閉所日数	87	
	現場閉所率	29.9%	4週8体以上

現場閉所の達成状況は、まず、月ごとの現場閉所率を確認し、4週8体を達成できていない月があれば、工事全体の現場閉所率を確認する

(別紙4)

土木工事の労務費補正について

(1) 週休2日工事

【補正係数について】

	月単位の週休2日工事	通期の週休2日工事
労務費	1.05	1.03
機械経費(賃料)	1.04	1.03
共通仮設費	1.04	1.03
現場管理費	1.06	1.04
